



**RD922**



Aménagement de créneaux de  
dépassement à SAINT-CERNIN

Avancement au 06.04.2022

# RD922 St-Cernin



Le 06.04.2022

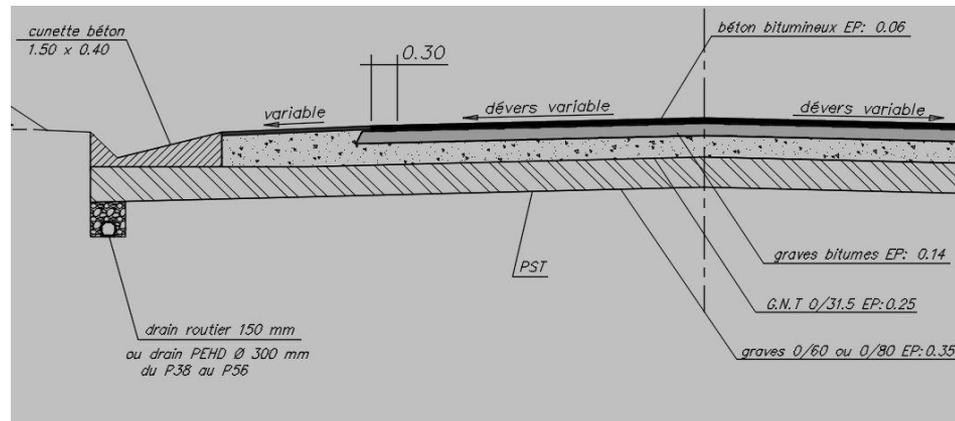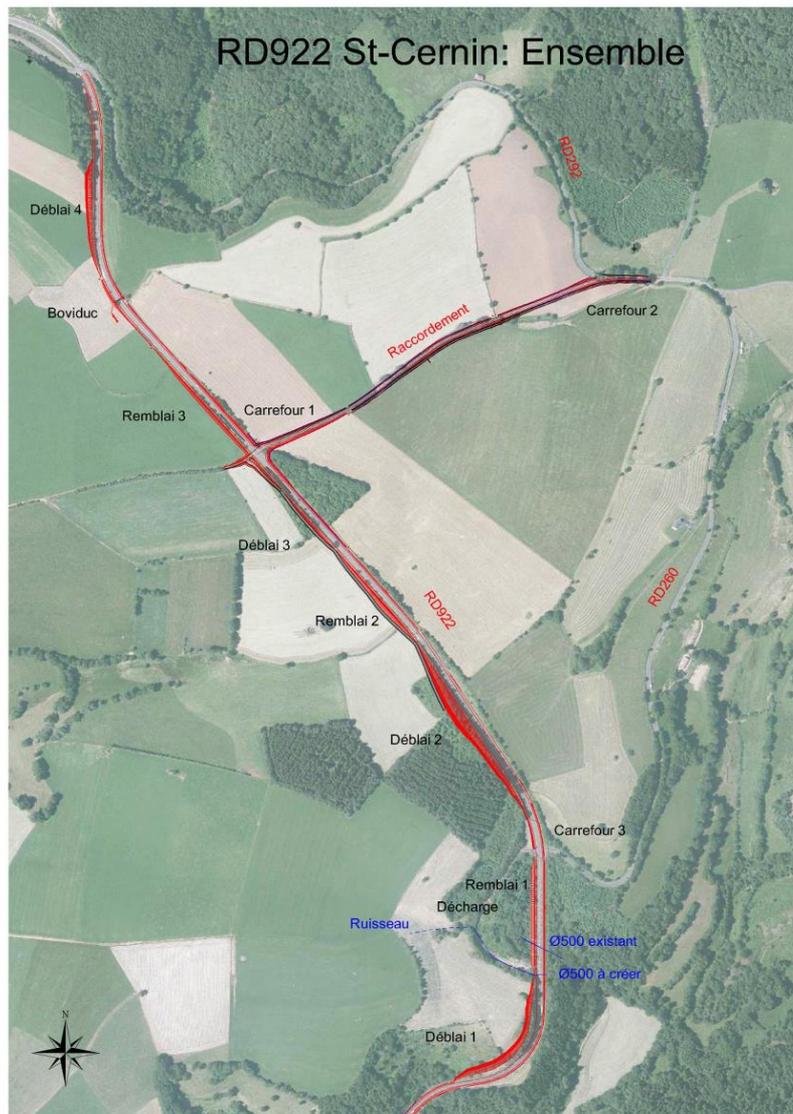

RD922 St-Cernin



Le Déblai 4

Le 06.04.2022



La cunette béton sera prolongée.



RD922 St-Cernin



Le Déblai 4

Le 06.04.2022



La zone purgée prête à recevoir le 0/80 qui est en cours de livraison.

RD922 St-Cernin



Le Déblai 4

Le 06.04.2022



Tous les regards sont coulés depuis le déblai 2 jusqu'ici.

Leur nu supérieur est à peine sous la cunette béton future.

Durant le coulage de celle-ci, une plaque métallique provisoire empêchera le béton de tomber dans le regard. Elle sera retirée durant la prise du béton.



RD922 St-Cernin



Le Déblai 4

Le 06.04.2022



La chargeuse met en place le  
0/80..

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 06.04.2022



Le 0/80 est en place mais n'est pas encore réglé finement par la niveleuse.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le raccordement

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le remblai 2

Le 06.04.2022



La poutre de rive.

RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 06.04.2022

avant

ce jour



RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le remblai 1

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 29.03.2022



Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 06.04.2022



En avant garde cette pelle arrache les éperons rocheux au ripper.

RD922 St-Cernin



La décharge

Le 06.04.2022



RD922 St-Cernin



Fin

