




RD922

Aménagement de créneaux de
dépassement à SAINT-CERNIN

Avancement au 09.03.2022

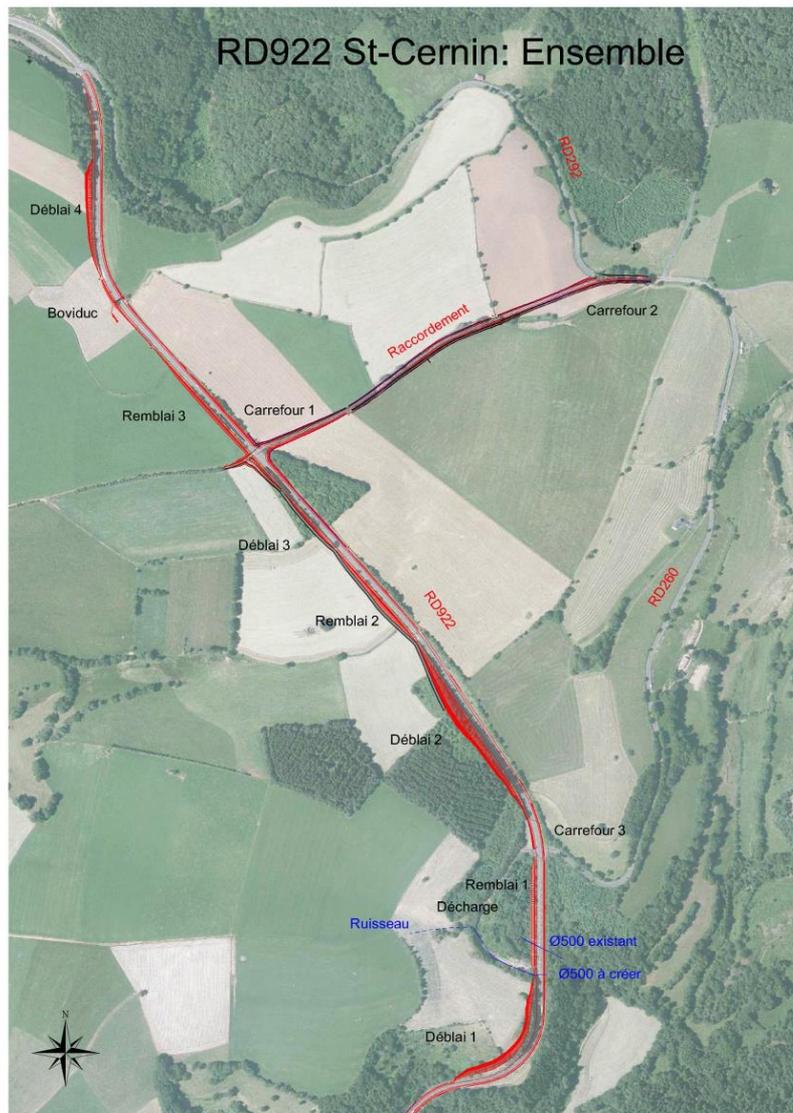

Les remblais 2 et 3 sont terminés, leur retaille et leur habillage en terre végétale est en cours.

Les déblais 2, 3 et 4 sont terminés.

L'assise du raccordement est partiellement décapée et servira à recevoir les déblais du décaissement.

Le boviduc sera prochainement prolongé.

Les glissières de sécurité à droite sont en cours de démontage.

En décharge le stockage de la terre végétale pour la remise en culture se poursuit.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 09.03.2022



La pelle retaille le talus en évacuant les excédents.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 09.03.2022



Les excédents constitués essentiellement de petits et gros blocs sont mis en décharge.

Leur transport est effectué par un camion 6x4 car la distance est pas rentable en dumper.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 09.03.2022



La taille effectuée, pendant l'absence du camion, la pelle habille le talus avec le cordon de terre végétale.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 09.03.2022



Les cailloux en pied seront évacués.

RD922 St-Cernin



Le remblai 2

Le 09.03.2022



Le cordon de végétale en pied n'ayant pas été suffisant, un complément sera mis en place.

RD922 St-Cernin



Le déblai 4

Le 09.03.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 4

Le 09.03.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 3

Le 09.03.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 09.03.2022



RD922 St-Cernin



Le boviduc

Le 09.03.2022



Un prolongement est nécessaire.

RD922 St-Cernin



Le boviduc

Le 09.03.2022



RD922 St-Cernin



Les glissières

Le 09.03.2022



Notre équipe de St-Flour est à l'œuvre.

RD922 St-Cernin



La décharge

Le 09.03.2022



Le départ du Ø500 métallique qui servira d'évacuation au drainage.

RD922 St-Cernin



La décharge

Le 09.03.2022



RD922 St-Cernin



La décharge

Le 09.03.2022



Stockage de terre végétale
provenant du raccordement se
poursuit.

Le bulldozer à l'œuvre.

RD922 St-Cernin



Fin
