



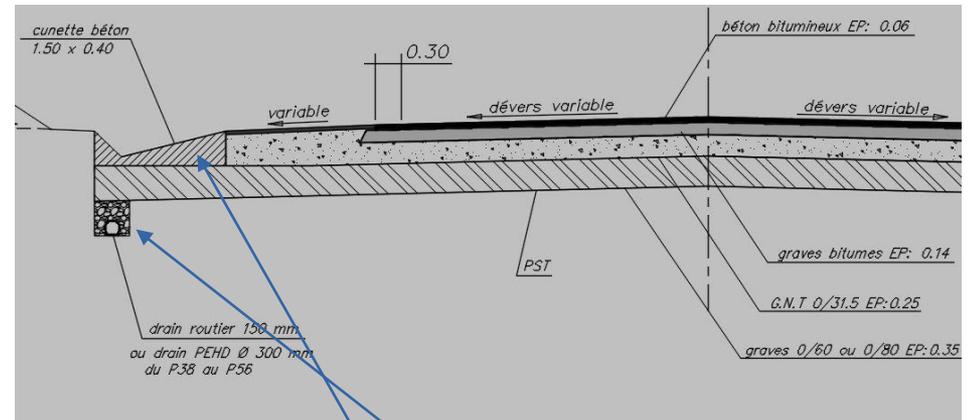

RD922

Aménagement de créneaux de
dépassement à SAINT-CERNIN

Avancement au 18.03.2022

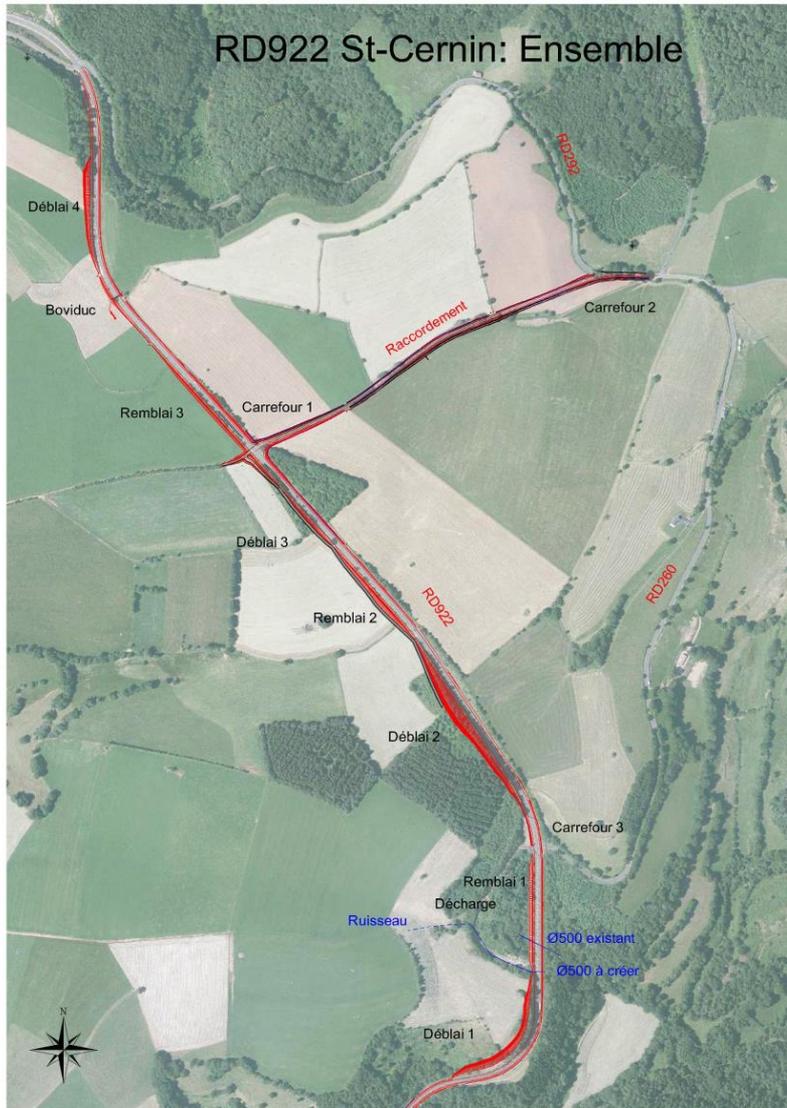

Le décaissement de la chaussée est terminé au déblai 4 (une purge a été nécessaire) et celui du déblai 2 est en cours. Ils anticipent le coulage de la cunette béton, les zones en remblai viendront après.

L'équipe assainissement réalise les traversées et le drain sous cunette.

Le déblai 1 est en cours.

Le raccordement reçoit les déblais des décaissements.

La décharge reçoit les matériaux impropres aux remblais.

RD922 St-Cernin



Le déblai 4

Le 18.03.2022



Le décaissement est terminé.

La couche de grave 0/80 suit.

RD922 St-Cernin



Le déblai 4

Le 18.03.2022



Le drain sous la future cunette.

La zone a été purgée.



RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 18.03.2022



Le transport se fait en camion vers le raccordement.



RD922 St-Cernin



Le raccordement

Le 18.03.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 18.03.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 18.03.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 18.03.2022



La glissière béton retient les éboulis...



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 18.03.2022



Les deux dumpers...



RD922 St-Cernin



La décharge

Le 18.03.2022



RD922 St-Cernin



Fin

