




RD42

Aménagement de la route d'Arnac
du PR37.010 au PR33.750


Avancement au 22.06.2022

RD42 St-Santin Cantalès: Profils types

Rechargement 0.15+0.05

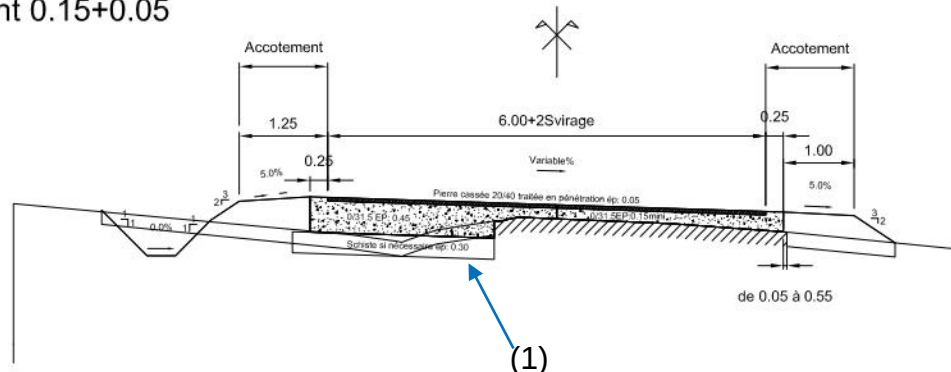

Rechargement 0.25+0.05
Du P58 au P89 et du P154 au P183

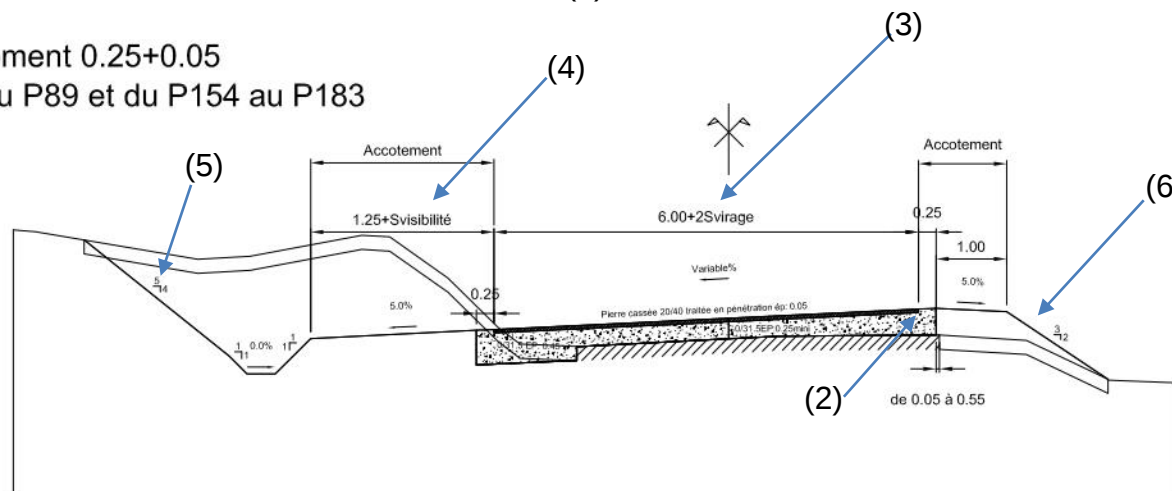

D'une manière générale en plan, le bord droit de la chaussée existante est décalé de 30 à 80 centimètres afin que la structure en 0,315 repose sur du dur. Des purges seront effectuées si nécessaire (1) .

Il n'est pas constitué de droites et de cercles tangents mais de segments droits dont le tracé suit méticuleusement l'actuel.

Ce bord droit (2) ainsi défini est décalé de 6m pour avoir le corps de chaussée correspondant et les surlargeurs en virage **Svirage** (3) y sont appliquées. (25/R pour chaque voie)

Des surlargeurs **Svisibilité** (4) en accotement sont appliquées afin de donner de la visibilité dans les virages qui le nécessitent.

Les pentes des talus de déblais (5) sont de 80% et non de 1/1 afin de ne pas avoir plus tard des glissements et aussi une meilleure esthétique.


Un fossé est créé afin d'assainir la fondation de la structure.

Les talus de remblais (6) ne sont pas habillés de terre végétale afin de stabiliser l'accotement sur toute sa largeur.

RD42 St-Santin



Situation

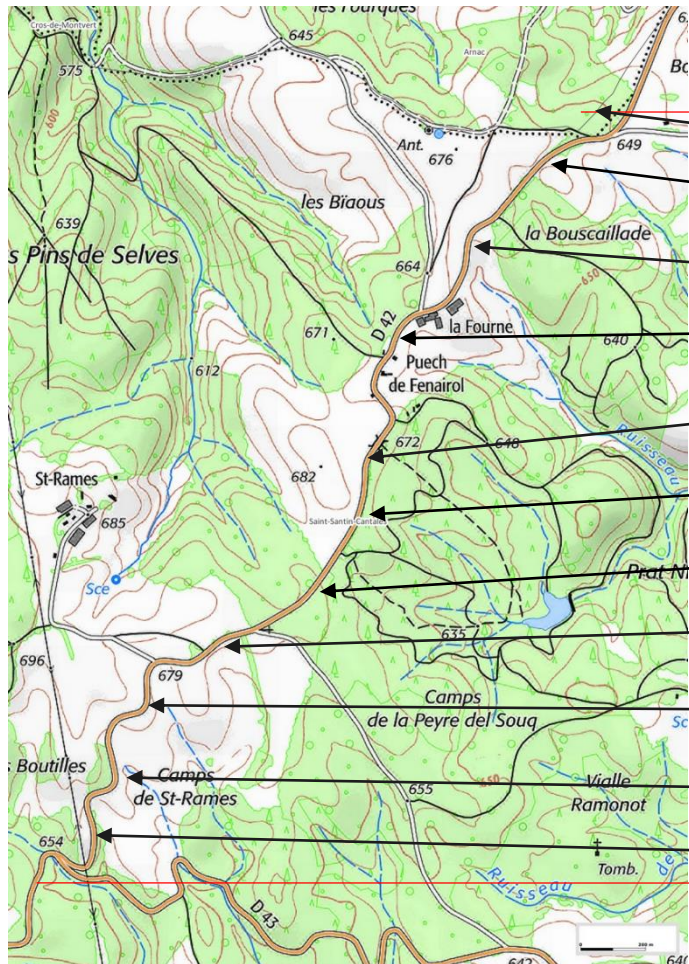

Fin du chantier

Zone 11

Zone 10

Zone 9

Zone 8

Zone 7

Zone 6

Zone 5

Zone 4

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Début du chantier



RD42 St-Santin



Résumé

Le 10.06.2022

Le chantier avance de la zone 1 en allant vers la zone 11 (3300 mètres):

L'entreprise Matière est en phase finitions (coulage des regards, passages busés et conduite A.E.P pour un agriculteur).

Un chargeur à chenille, un camion et une pelle remettent en culture la parcelle de l'emprunt en zone 11.

L'entreprise Colas commence à approvisionner et à régler le 0/31.5.

RD42 St-Santin



Zone 1

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 1

Le 22.06.2022



Le 0/31.5 est arrosé.

RD42 St-Santin



Zone 1

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 1

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 1

Le 22.06.2022



L'ancienne chaussée a été scarifiée.

RD42 St-Santin



Zone 2

Le 22.06.2022



L'ancienne chaussée a été scarifiée.

RD42 St-Santin



Zone 2

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 3

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 3

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 3

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 5

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 6

Le 22.06.2022



L'implantation de la chaussée se fait au GPS.

RD42 St-Santin



Zone 7

Le 22.06.2022



Le dégagement de visibilité.

RD42 St-Santin



Zone 8

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 9

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 9

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 10

Le 22.06.2022



RD42 St-Santin



Zone 11

Le 22.06.2022



La remise en culture.

RD42 St-Santin



Les chefs de chantier

Le 22.06.2022



Pour l'entreprise MATIERE:
Benjamin va suivre le chantier jusqu'à la fin puisque Jean-Pascal Esnou est officiellement à la retraite jeudi prochain.



Pour l'entreprise COLAS:
Anne-Sarah implante la chaussée et gère l'atelier.
C'est une jeune ingénieure bretonne qui aime beaucoup le Cantal.

RD42 St-Santin



La carrière d'Arnac

Le 22.06.2022





FIN
